## 達成度「C：計画を下回る」と評価された実施計画の詳細

| ID | 担当課 | 計画の内容 | 遅れの理由 | | 区分 | 今後の対応 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 都市企画課<br>中心市街地整備課 | 都市計画マスタープランの見直しと立地適正化計画の策定 | プランと計画に盛り込む内容について市民政策コメントを実施したが、1件のコメントもなかったため、現状では市民に周知不足であると判断した。このため、計画完成時期をさらに延期し、市民の理解と協力を得ようとするもの。 | 内部作業の遅れ | 計画策定・新規事業の準備等 | |
| 8 | 協同推進課 | 地区公民館の活用の基本方針の策定 | 市民自治推進委員会以外の外郭団体からの意見収集ができておらず。全体的にスケジュールが押している状況。 | 内部作業の遅れ | 計画策定・新規事業の準備等 | |
| 11 | 行財政改革課 | 外部委託推進方針および指定管理者制度活用ガイドラインの見直し | 指定管理者制度活用ガイドラインの見直しは計画どおり進捗しているが、外部委託推進方針の見直し作業が遅れている。今年度末の窓口業務委託調査（富士通総研）の結果を待って内容、スケジュール等再検討することとしている。 | 内部作業の遅れ | 計画策定・新規事業の準備等 | |
| 13 | 地域振興課 | 地域推進型移住定住の促進（空き家と移住希望者とのマッチング） | 昨年度まで対象としていた4支所エリア（河原、佐治、鹿野、青谷）のほか新たに気高支所エリアを追加するなど、計画に沿った事業は実施しており、マッチング件数も伸びているが、年度目標に届かなさそうな見込み。 | 目標値に未達 | 現在進行中の事業 | 成果指標の見直しが必要か |
| 16 | 広報室<br>市民総合相談課 | 広聴・広報一体化基本方針の策定 | 平成27年度より遅れの生じていた事業であるが、政策決定過程のフローを方針に組み込むための他課協議に遅れが生じている。 | 内部作業の遅れ | 計画策定・新規事業の準備等 | |
| 20 | 広報室 | 登録制に基づく、職員採用試験情報及び市内誘致企業等の就職情報の配信 | 部内協議の結果、独自に登録者を集めメール配信するのではなく、地域振興課が実施しているUターン登録支援制度と合わせた事業展開をおこなうこととした。当該制度の登録者のうち学生の登録者数が伸びず苦慮している。 | 目標値に未達 | 現在進行中の事業 | |
| 21 | 政策企画課 | すごい！鳥取市婚活サポートセンターの運営<br>参加しやすい婚活イベントの実施 | 計画どおり婚活イベントはコンスタントに実施できており、カップル成立にも至っているが、成婚者数が目標値に届かなさそうな見込み。 | 目標値に未達 | 現在進行中の事業 | 成婚率という指標はアウトカム？指標再検討も必要か |
| 22 | 中央保健センター | 不妊治療制度の拡充<br>不育治療費補助制度の創設<br>民間企業への不妊・不育治療休暇制度導入の勧奨 | 不妊治療助成制度拡大の周知や、民間企業へ向けての啓発用資料の作成が遅れている。 | 内部作業の遅れ | 現在進行中の事業 | |
| 25 | 高齢社会課 | 高齢者を対象とした外出支援の拡充 | 介護支援ボランティアの登録者数がやや伸び悩んでいる。 | 目標値に未達 | 現在進行中の事業 | |
| 27 | 生涯学習・スポーツ課 | 高齢者を対象とした生涯学習の推進（新たな高齢者生涯学習の形態案作成） | 今後の高齢者生涯学習の形態について案を作成する目標としていたが、現在の情報収集、実態把握は不十分な状況。 | 内部作業の遅れ | 計画策定・新規事業の準備等 | |
| 42 | 道路課 | 各種インフラ長寿命化計画の策定 | 長寿命化計画、修繕計画の策定は、実効性のあるものとするため、有識者の意見を取り入れようとしており、その作業等に時間を要している。 | 内部作業の遅れ | 計画策定・新規事業の準備等 | |
| 49 | 行財政改革課 | 補助金に対するサンセットルールの策定 | 各補助要綱にサンセットルールを盛り込んだ改正を施すよう指導してきたが、そこに至っていないものが多い。 | 内部作業の遅れ | 計画策定・新規事業の準備等 | まずはサンセットルール適用数を増やすなどの目標から順にクリアするなどアプローチを検討 |
| 57 | 行財政改革課 | 第2次外郭団体の経営改善及び統廃合に関する方針の策定と土地開発公社経営健全化計画の見直し | 土地開発公社経営健全化計画の見直しについては、各事項ごとに検討しているが、市民合意を得る必要もあり、有利な財源を活用し買い戻すような事業立案等には至っていない。外郭団体の2次方針については、1次方針の取り組みによる分析等に時間を要したため策定作業が遅れている。 | 内部作業の遅れ | 計画策定・新規事業の準備等 | |
| 59 | 市立病院 | 第2次鳥取市立病院改革プランの策定と実施 | 医師奨学生の募集をするも応募者がなく、また各大学へ医師確保要請を行っているが人員の確保に苦慮している。（成果指標は経常収支比率でとってあるが、そこに向けた取り組みの一つである人員確保の取り組みに苦慮している。） | 内部作業の遅れ | 計画策定・新規事業の準備等 | |
| 67 | 行財政改革課 | システム再構築を契機とした既存事務手順の棚卸と業務手順書の再整備 | 現在、総務省の業務改革モデルプロジェクトの採択を受け、市民課委託の窓口業務調査（富士通総研）を平成29年2月28日まで実施しており、手順書の整備はその結果待ちとしている。 | 第三者の影響等による計画の遅れ | 計画策定・新規事業の準備等 | |

### C判定の実施計画の分析

| | |
|---|---|
| 達成度C判定の計画数 | 15件 |

事業内容の区分

| | 計画策定・新規事業の準備等 | 現在進行中の事業 | 全体 |
|---|---|---|---|
| 件数 | 10件 | 5件 | 15件 |
| 割合 | 66.7% | 33.3% | 100% |

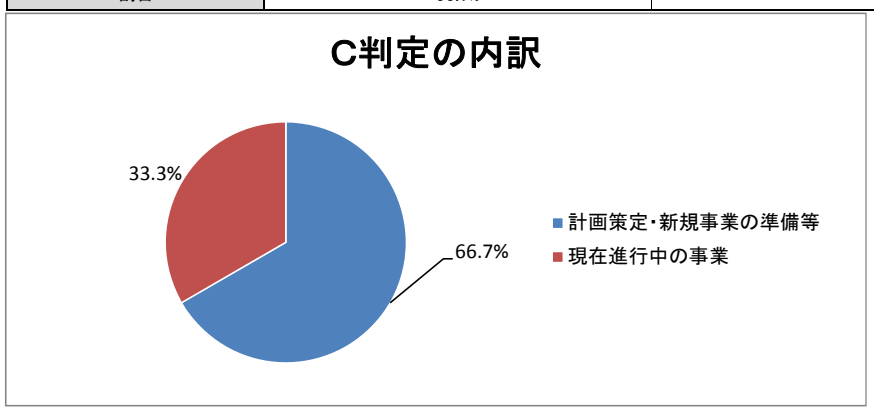


達成度Cの理由
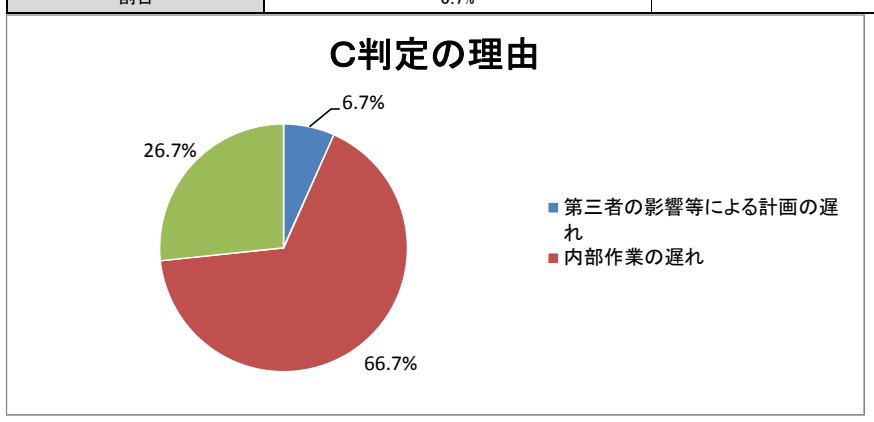
| | 第三者の影響等による計画の遅れ | 内部作業の遅れ | 目標値に未達 | 全体 |
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 1件 | 10件 | 4件 | 15件 |
| 割合 | 6.7% | 66.7% | 26.7% | 100% |
