平成27年度末時点での達成度「C：計画を下回る」と評価された実施計画の経過

ID	担当課	計画の内容	遅れの理由		区分	H28.9での状況
1	中核市推進局	中核市移行に向けた準備	移譲事務事業の調整と基本構想の策定は完了したが、財政影響額および職員体制の試算はH28にずれ込んだ。	内部作業の遅れ	計画策定・新規事業の準備等	現在作業中（年内取りまとめを目標としている）
3	政策企画課 文化財課	シティセールス戦略プランの作成	H28年度に実施されるシティーセールス戦略会議の結果も盛り込むこととしたため、プランの完成はその会議後にずれ込んだ。	第三者の影響による計画の遅れ	計画策定・新規事業の準備等	第三四半期に達成予定 順調に推移
5	都市企画課 中心市街地整備課	都市計画マスタープランの見直しと立地適正化計画の策定	プランと計画に盛り込む内容の検討に時間を要しており全体のスケジュールが遅れた。（スケジュールを見直しH27年度は素案完成までとした）H28年4月にパブリックコメントを行い、7月以降に完成予定。	内部作業の遅れ	計画策定・新規事業の準備等	第二四半期で完成（ただし公表は延期中）
11	行財政改革課	外部委託推進方針および指定管理者制度活用ガイドラインの見直し	指定管理者制度活用ガイドラインの見直しは計画どおりだが、外部委託推進方針の見直し作業が遅れている。	内部作業の遅れ	計画策定・新規事業の準備等	現在作業中（第四四半期完成予定）
12	児童家庭課	第2次民営化計画の策定	計画に盛り込む民営化対象となる保育園の選定について、保護者会との調整が遅れている。	第三者の影響による計画の遅れ	計画策定・新規事業の準備等	現在作業中（第四四半期完成予定）
13	地域振興課	地域推進型移住定住の促進（空き家と移住希望者とのマッチング）	現在対象としている4つの支所エリア（河原、佐治、鹿野、青谷）のうち2つの支所エリア（佐治、鹿野）でしか空き家を確保することができなかった。また移住世帯数も目標値に届かなかった。	目標値に未達	現在進行中の事業	H28も目標値達成に苦慮している
16	広報室 市民総合相談課	広報・広聴一体化基本方針の策定	方針に盛り込む内容検討（市民からの意見や要望をどの範囲で市民ニーズと捉えるのかなどの判断）に時間を要した。	内部作業の遅れ	計画策定・新規事業の準備等	現在作業中（第四四半期完成予定）
17	広報室 市民総合相談課	政策決定過程において市民の意見を反映させる仕組みの再構築	No.16と同時に検討しているため同様に遅れた。 ※ただし、今後はNo.16と統合するため本件は廃止。	内部作業の遅れ	計画策定・新規事業の準備等	―
27	生涯学習・スポーツ課	高齢者を対象とした生涯学習の推進（新たな高齢者生涯学習の形態案作成）	H27では今後の高齢者生涯学習の形態について案を作成する目標としていたが、現状の情報収集およびその分析に時間を要し、案の作成に至っていない。	内部作業の遅れ	計画策定・新規事業の準備等	現在作業中（情報収集に苦慮している）
46	財産経営課 生涯学習・スポーツ課	不用品公売等の実施	インターネット公売ガイドラインを作成し、公売を実施したが、落札件数は目標に達しなかった。	目標値に未達	現在進行中の事業	H28は上半期で目標達成
49	行財政改革課	補助金に対するサンセットルールの策定	サンセットルールを盛り込んだ補助金適正化方針の策定が遅れ、各課にルール徹底（要綱改正）が行き届かなかった。	内部作業の遅れ	計画策定・新規事業の準備等	現在作業中（第四四半期完成予定）
53	行財政改革課	新地方公会計導入の検討	新地方公会計に対応したシステムを導入するための仕様書作成やそれに伴う業者選定が遅れたため、庁内連携組織の設置に至らなかった。	内部作業の遅れ	計画策定・新規事業の準備等	遅延していた庁内連携組織の必要性を再検討した結果、設置不要となった
57	行財政改革課	第2次外郭団体の経営改善及び統廃合に関する方針の策定と土地開発公社経営健全化計画の見直し	土地開発公社経営健全化計画の見直しについては、現本庁舎跡地が県立美術館の候補地になったことなどの影響で具体的な検討に入れなかった。外郭団体の方針策定についてはH27では取り組みが行えていない。	内部作業の遅れ	計画策定・新規事業の準備等	現在作業中（第四四半期完成予定）
59	市立病院	第2次鳥取市立病院改革プランの策定と実施	プランについては県が策定する「地域医療構想」との整合性が必要となるため、先送りとした。	第三者の影響による計画の遅れ	計画策定・新規事業の準備等	第三四半期以降に策定予定
60	水道局	上水道事業と下水道事業の組織統合の検討と簡易水道事業との事業統合の推進	簡易水道事業との事業統合に必要な施設整備計画の策定などに遅れが生じている。	内部作業の遅れ	計画策定・新規事業の準備等	第三四半期以降に完成予定。
63	下水道企画課	下水処理上の統廃合の推進	工事自体が遅れており、年度繰り越しとなるものがある。また次期計画についても、地元調整などに遅れが生じ、国・県からの承認がH28年度となる。	第三者の影響による計画の遅れ	現在進行中の事業	遅延していた工事は上半期で完了
64	情報政策課	総合窓口システムの導入による窓口サービスの見直し	マイナンバー利用を前提とした窓口システムを構築するための仕様確定および開発に時間を要しており、システム稼働が遅れる。	内部作業の遅れ	計画策定・新規事業の準備等	遅延していたシステム稼働は9月に試行開始した
67	行財政改革課	システム再構築を契機とした既存事務手順の棚卸と業務手順書の再整備	窓口システムの構築と併せて業務手順も整備するため同時に遅れが生じている。	内部作業の遅れ	計画策定・新規事業の準備等	第四四半期に情報収集し、再度仕切りなおす

平成27年度末の年度評価の結果遅れが生じていたものの、その後の経過

C判定の実施計画の分析

達成度C判定の計画数	18件

事業内容の区分

	計画策定・新規事業の準備等	現在進行中の事業	全体
件数	15件	3件	18件
割合	83.3%	16.7%	100%

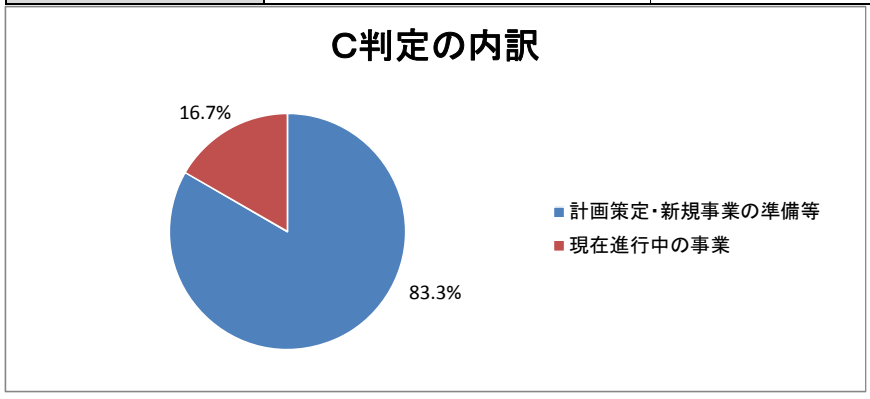

達成度Cの理由
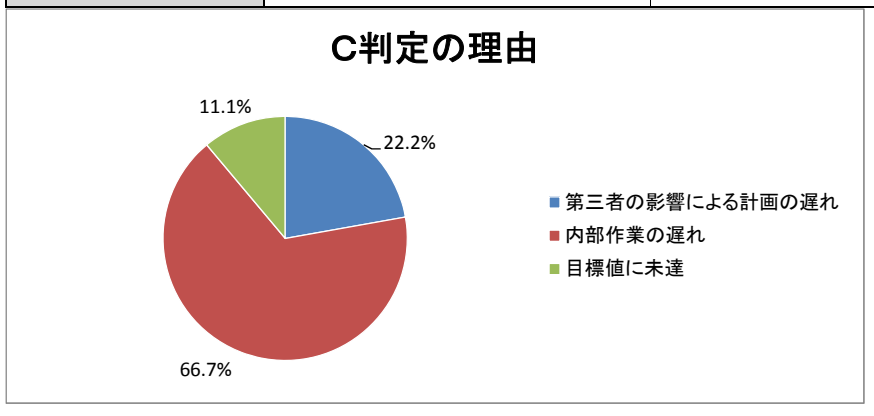
	第三者の影響による計画の遅れ	内部作業の遅れ	目標値に未達	全体
件数	4件	12件	2件	18件
割合	22.2%	66.7%	11.1%	100%
